특수공시

▣ 재원별 현황

(단위: 백만원)

연번	재원별 / 사업별	총 사업비	국비 광특, 기금	시 비	특 별 교부세	특 별 교부금	구 비	추 진 부서명
1	장애인 재활센터 신축	2,566	8		1,300	1,000	258	복지지원과
2	환경차량 주차지 조성	805				600	205	녹색환경과
3	앞산 맛둘레길 조성사업	10,000	5,000	1,900	200	1,000	1,900	도시재생총괄과
4	문화예술 생각대로 조성사업	10,000	5,000	2,500		250	2,250	도시재생총괄과
5	삼각지 네거리~ 프린스호텔 하수관거 조성	700			700			건설방재과
6	안전한 보행환경	500			500			건설방재과
7	바다맛길 공영주차장	655					655	교통과
8	안지랑곱창 공영주차장	2,092		1,000	500		592	교통과
9	CCTV 구축	200				200		민원정보과

1. 장애인재활센터 신축

지역사회 장애인의 재활과 사회 통합을 위하여 장애인의 다양한 복지욕구 해소 및 맞춤형 복지서비스 제공

□ 사업개요

- ❍ 위　　치 : 대구광역시 남구 대봉로 112-1(이천동)
- ❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- ❍ 사업규모 : 연면적 599.96㎡(지상2층)
- ❍ 사 업 비 : 2,566백만원(특별교부세 1,300, 특별교부금 1,000, 국비 8, 구비 258)

  ※ 부지매입비, 장비구입비 등 포함
- ❍ 주요시설 : 장애인 공동작업장 , 재활 및 체력단련실, 사무실 등
- ❍ 연도별 투자현황　　(단위:백만원)

구 분		2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
예산액	2,566	800	1,000	766	-	
집행액	2,295	-	1,091	403	801	

※ 2014. 6. 30일 현재

□ 추진상황

- ❍ 부지 매매계약 : 2012. 5. 22.
- ❍ 건물착공 : 2013. 10. 21
- ❍ 센터설치 및 운영에 관한 조례 제정공포 : 2014. 4. 10
- ❍ 건물준공 : 2014. 4. 30

□ 기대효과

- ❍ 장애인 재활의지를 키워 줌으로써 다양한 복지욕구 충족
- ❍ 장애인 근로기회 제공으로 일자리 창출 및 자활자립 기여

장애인재활지원센터 건립 부지 전경

장애인재활지원센터 건립(준공)

2. 환경차량 주차지 조성

한·미 연합토지 관리계획(LPP) 협의와 관련, 현 환경차량주차지로 사용중인 부지 미군에 반환함에 따른 주차지이전

□ 사업개요

- ❍ 위　　치 : 남구 대명동 413 외 6필지
- ❍ 공사기간 : 2012년 ~ 2014년
- ❍ 시설규모 : 가설건축물(창고 1층), 아스팔트포장덧씌우기 1,881㎡, 메쉬펜스, 조경, 기존 차고지 건축물 철거 등
- ❍ 사 업 비 : 805백만원(특별교부금 600, 구비 205)
- ❍ 연도별 투자현황　　(단위:백만원)

구 분		2012년	2013년	2014년	비 고
예산액	805	600	205	-	
집행액	515	20	489	6	

□ 추진상황

- ❍ 2012.09.17 : 큰골 제2주차장 관리이관(대구시 ⇒ 남구청)
- ❍ 2012.12.14 : 토목,건축,설비(기계)업체 계약의뢰 및 입찰공고
- ❍ 2012.12.26 : 최종낙찰자 결정
- ❍ 2013.01.14 : 공사착공
- ❍ 2013.12.13 : 공사준공

□ 향후계획

- ❍ 시설물 보강 및 환경개선 : 2014. 12월한(88백만원 집행예정)

□ 기대효과

- ❍ 차고지 이전으로 차량 활용의 극대화
- ❍ 앞산 큰골 제2공영주차장 관리이관으로 예산절감

▼ 【신축 환경차량 주차지】 공사 전

▼ 【신축 환경차량 주차지】 공사 후

3. 앞산맛둘레길 조성사업

대구 시민의 휴식처인 앞산을 찾는 시민에게 지역 특색에 맞는 특화된 거리 조성으로 앞산의 정체성을 살리고 침체 되어 가는 상권 활성화로 도시활력화의 선진 모델 제시

□ 사업개요

❍ 위　　치 : 현충삼거리~ 앞산빨래터공원 일원

❍ 사업기간 : 2010 ~ 2014년

❍ 사업규모 : L=1.5km

❍ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 특별교부금 1,000, 특별교부세
200원, 시비 1,900, 구비 1,900)

❍ 사업내용

- 차선 보도공간 확보로 보행자중심의 저탄소 녹색성장 웰빙거리 조성
- 옹벽, 교량 및 한전지중화, 간판 개선 등을 통해 친환경 공간 창출

❍ 연도별 투자 현황

(단위:백만원)

구 분		기투자	2012년	2013년	2014년
예산액	10,000	4,800	2,668	2,000	532
집행액	9,332	2,982	3,624	2,635	91

※ 2014.6.30일 현재

□ 추진상황

❍ 기본 및 실시설계 용역 : '10. 6. 15 ~ '11. 1. 11

❍ 간판정비사업 추진 : '10. 12. 21 ~ '11. 5. 31

❍ 체계 구축(협의체 구성, 조례 등) : '11. 4월 ~ '11. 8월

❍ 교량 및 육교 디자인 개선사업 : ’11. 9월
❍ 1단계(보도, 차도, 한전지중화, 조명 등)공사 준공 : ‘12. 3월
❍ 2단계(벽천, 주민마당) 준공 : ’13. 5월
❍ 앞산별자리 체험 • 학습장조성공사 준공 : ’13. 8월
❍ 프로그램 사업 : 자락길 걷기, 사진 교실, 외국인 음식 문화체험 등
※ 2011년~2013년 실적평가 : 3년 연속 중심시가지분야 S등급
※ 2012년 지역발전사업 평가 우수사례 선정
※ 2012년 도시대상 선도사례부문 장관상
※ 2013년 도시재생우수사례 발표대회 대상

□ 향후계획

❍ 앞산맛둘레길 상징입간판(원폴화) 등 제작 설치 : ’14. 8월
❍ 앞산 커뮤니티센터 및 추가 주차장 조성 : ’14. 8월~12월
❍ 조형물 설치 : ’14. 9월~12월

□ 기대효과

❍ 앞산이 가진 자연 그대로의 아름다움을 보존한 환경개선을 통해 도심 속 시민 쉼터로 조성
❍ 주민주도형 상향식 도심개발사업 추진으로 주민의 주인의식 고취
❍ 지역이미지 제고를 통한 지역브랜드 창출로 지역경제 활성화 및 주변지역 시너지효과 강화

▼ 【보행공간개선 공사 전·후】

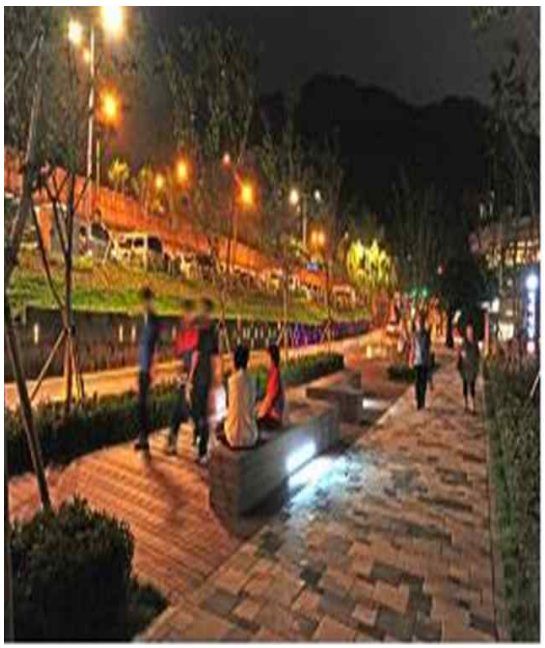

▼ 【안지랑마당 조성공사 전·후】

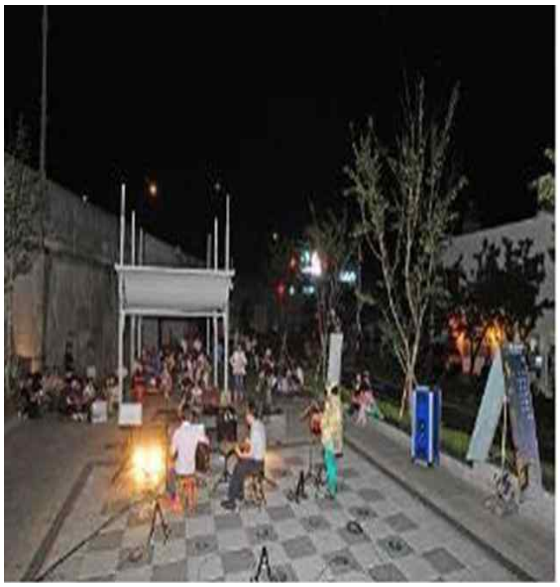

▼ 【벽천 조성공사 전·후】

▼ 【앞산별자리체험·학습장 공사 전, 후】

4. 문화예술 생각대로 조성사업

중앙대로 차로축소 및 보행공간 확대로 자연친화적 녹색 휴식공간 조성하고 청소년 창작센터 건립, 청소년 블루존 조성으로 청소년문화의 메카로 부상 기대

□ 사업개요

❍ 위　　치 : 영대병원네거리～명덕네거리～청소년문화의집

❍ 사업기간 : 2011 ～ 2015년

❍ 사업규모 : L=1.8㎞

❍ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000원, 시비 2,500, 특별교부금 250, 구비 2,250)

❍ 사업내용

- 차선축소 및 보도공간 확보로 보행자중심의 특화거리 조성
- 청소년문화거리 조성, 청소년창작센터 건립, 옹벽개선 등
- 추진참여 네트워크 구축 및 각종 축제 등 프로그램사업 활성화

❍ 연도별 투자 현황

(단위:백만원)

구 분		2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
예산액	10,000	2,000	2,900	3,600	1,000	500
집행액	7,445	1,458	1,691	3,462	834	

※ 2014. 6. 30일 현재

□ 추진상황

❍ 교통처리대책수립용역 : '11. 3월 ～ 9월

❍ 옹벽디자인 개선사업 : '11. 3월 ～ 11월

❍ 체계구축(협의체 구성, 조례, 주민협약 등) : '11. 4월 ～ '11. 8월

❍ 기본 및 실시설계용역 : ’11. 7월 ~ ’12. 3월
❍ 문화예술생각대로조성사업(1단계-중앙대로) : ’12. 7월 ~ ’13. 10월
❍ 문화예술생각대로조성사업(2단계-청소년블루존1구간) : ’13. 6월 ~ 10월
❍ 청소년창작센터 건립 : ’13. 3월 ~ 11월
❍ 문화예술생각대로조성사업(2단계-청소년블루존2구간)착공 : ’14. 3월
❍ 프로그램사업 : 선진지 답사, 마을영화제, 청소년디자인학교, 물베기축제 등
※ 2011년~2013년 실적평가 : 3년 연속 중심시가지분야 S등급
※ 2013년 도시대상 선도사례 부문 국무총리상

□ 향후계획

❍ 문화예술생각대로조성사업(2단계-청소년블루존2구간)준공 : ’14. 12월
❍ 입면정비(간판개선), 안내판 제작 등 : ’15년

□ 기대효과

❍ 지역주민의 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화로 국정최고가치인 국민의 행복 실현

▼ **【옹벽 개선 공사 전·후】**

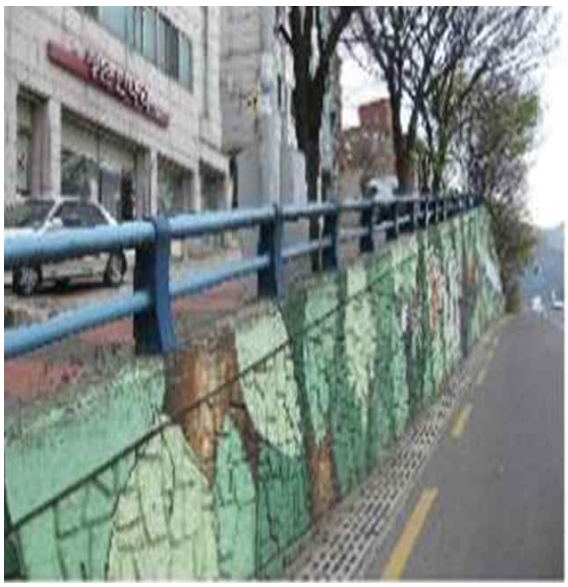

▼ 【문화예술생각대로조성사업-2단계 : 청소년블루존1차구간 공사 전·후】

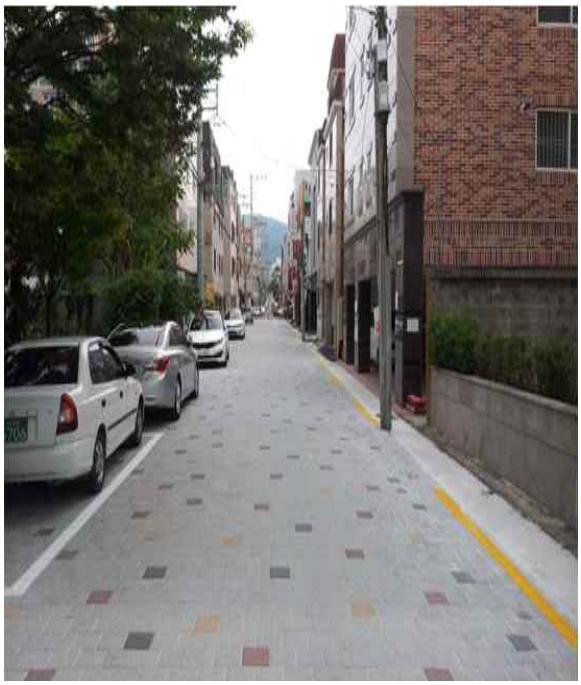

▼ 【청소년창작센터 건립】

5. 삼각지네거리~프린스호텔 하수관거 정비

❍ 원활한 통수능력 확보하여 집중호우로 인한 침수예방 ❍ 도로포장 정비로 도시미관 개선 및 주민복지 향상

□ 사업개요

❍ 위　　치 : 남구 대명2,3동

❍ 사업기간 : 2013. 6. ~2014. 12.

❍ 사업규모 : 조립식 PC암거(1.5×1.5m) L=290m, (2.5×2.0m) L=31m,하수관로(D1,200㎜) L=192m,(D400㎜) L=4,408m 기존 암거 보수보강

❍ 사 업 비 : 2,900백만원(하수도특별회계 2,200, 일반회계 700)

❍ 연도별 집행 현황　　(단위:백만원)

구 분		2012년	2013년	2014년	비 고
예산액	2,900	-	1,700	1,200	
집행액	1,372	-	1,372		공사중

※ 2013년 예산액 17억(일반회계 7억, 하수도특별회계 10억)

□ 추진상황

❍ 조립식 PC암거 설치 완료 L=321m

❍ 하수관로(D1,200㎜) 매설 완료 L=192m

❍ 기존 하수관거 보수보강 완료 L=300m

❍ 하수관로(D400㎜) 매설 L=2,382m

□ 기대효과

❍ 집중호우시 배수불량으로 인한 주민불편 해소

❍ 하수관로 매설후 기존 도로 재포장으로 도시미관 개선

▼ 【삼각지네거리~프린스호텔 하수관거 조성공사】 공사중

▼ 【삼각지네거리~프린스호텔 하수관거 조성공사】 공사후

6. 안전한 보행환경 조성공사

봉덕시장을 이용하는 보행자의 통행량은 많으나 인도 미설치로 인하여 보행자의 안전을 크게 위협하고 있어 인도신설 및 도로정비를 통하여 보행자 편의제공 및 일대의 도시미관 향상 및 교통흐름 환경을 개선코자 함

□ 사업개요

- ❍ 위　　치 : 대봉로(봉덕로~희망로)
- ❍ 사업기간 : 2013. 9. 23 ~ 2013. 11. 21
- ❍ 공사개요 : 인도조성 B=2m, L=330m
- ❍ 사 업 비 : 500백만원(특별교부세)
- ❍ 연도별 집행 현황

(단위:백만원)

구 분		2012년	2013년	2014년	비 고
예산액	500		500		
집행액	500		500		

□ 추진상황

- ❍ 특별교부세 결정 : 2013년 5월
- ❍ 실시설계 : 2013년 6월 ~ 7월
- ❍ 입찰 및 시공사 선정 : 2013년 8월 ~ 9월
- ❍ 공사착공 : 2013년 9월
- ❍ 공사준공 : 2013년 11월

□ 기대효과

- ❍ 대봉로 이용 주민 보행편의 및 운전자 교통환경개선 효과
- ❍ 도시미관 향상 및 봉덕시장 활성화 기여

▼ 【안전한 보행환경】 공사전

▼ 【안전한 보행환경】 공사후

7. 바다맛길 공영주차장 조성공사

❍ 바다맛길 회타운 육성 및 지역상가 활성화의 원활한 추진을 위하여, 마을단위 공영주차장을 조성하여 상가방문객 및 지역주민들의 주차불편 해소

□ 사업개요

❍ 위　　치 : 대명10동 1225-31번지 외 1필지

❍ 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2013. 7월

❍ 사업규모 : 면적 431.4㎡(≒130평) / 주차면수 22면

❍ 사 업 비 : 655백만원(주차장특별회계)

❍ 연도별 집행 현황

(단위:백만원)

구 분		2012년	2013년	2014년	비 고
예산액	655		655		
집행액	655		655		

□ 추진상황

❍ 2013. 2월 : 공영주차장 조성 계획 수립

❍ 2013. 5. 15 ~ 7. 22 : 공사기간

❍ 2013. 7. 22 : 주차장 개장

□ 기대효과

❍ 상가방문객 및 지역주민들에게 주차공간 제공으로 상가와 주택가의 이웃간 주차갈등 해소

❍ 음식 문화존 바다맛길 경관사업과 병행추진으로 지역상가 활성화 기여

▼ 【바다맛길 공영주차장 조성공사 】 공사전

▼ 【 바다맛길 공영주차장 조성공사 】 공사후

8. 안지랑 곱창 공영주차장(1,2) 조성공사

❍ 안지랑시장 및 곱창골목 이용자 증가에 따른 인근 주민간 주차 갈등으로 인한 주차불편 해소 ❍ 전국 명소를 거듭나고 있는 곱창골목 이미지 부각 및 지역 상권 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 위　　치 : 대명9동 902-14번지 외 3필지

❍ 사업기간 : 2012. 11월 ~ 2013. 7월

❍ 사업규모 : 면적 1,095.9㎡(≒332평) / 주차면수 47면

❍ 사 업 비 : 2,092백만원(시비 1,000, 특별교부세 500, 구비 592)

❍ 연도별 집행 현황

(단위:백만원)

구 분		2012년	2013년	2014년	비 고
예산액	2,092	836	1,256		
집행액	2,092	102	1,990		

□ 추진상황

❍ 2012. 11월　　: 공영주차장 조성 계획 수립

❍ 2013. 5. 3 ~ 7. 19 : 공사기간

❍ 2013. 7. 22　　: 주차장 개장

□ 기대효과

❍ 남구의 『젊음의 거리 안지랑곱창골목』특성화로 찾고 싶은 명소 이미지 제고 및 지역경제 활성화 기여

❍ 주차장 조성으로 상가방문객 주차공간 제공으로 주차불편 해소 및 인근주민의 빈번한 주차불편 민원 해결

▼ 【 안지랑 곱창 제1공영주차장 조성공사】

공사전

공사후

▼ 【안지랑 곱창 제2공영주차장 조성공사】

공사전

공사후

9. 생활안전 CCTV 구축사업

구민이 행복한 고품격 안전도시 기반 구축을 위한 범죄 예방활동 강화 및 활기차고 생동감 넘치는 살고 싶은 남구 조성 지원을 위한 안전영상정보인프라를 확대 구축하고자 함

□ 사업개요

❍ 위　　치 : 대구광역시 남구 명덕로50길 31외 16개소 17대

❍ 사업기간 : 2013. 5. ~ 2013. 11.

❍ 사업내용 : 관내 방범취약지역 메가픽셀 IR스피드돔 카메라 및 현장 시스템 확대 설치

❍ 사 업 비 : 특별교부금 200백만원(집행액 162백만원)

□ 추진상황

❍ 설치장소 협의 및 계획수립 : ~ 2013. 5.

❍ 설계, 계약발주 및 시행 : 2013. 6. ~ 2013. 8.

❍ 추가 설치계획 수립 및 설계 : 2013. 10.

❍ 계약발주 및 시행 : 2013. 10. ~ 2013. 11.

□ 기대효과

❍ 관내 방범 취약지역 범죄 예방활동 강화 및 안심 보행거리 조성을 통한 활기차고 역동적인 고품격 안전도시 기반구축

❍ 기존 도시 기반시설 환경에 최적화된 시스템 설치로 쾌적하고 아름다운 거리조성 지원

❍ 안전영상인프라 확대 보강 및 기능 개선을 통한 통합관제센터 기반 구축

생활안전 CCTV 구축사업

설치 전

설치 후
